

VOLLHEIA VA UTBYGGING SA

Sted: Vollen. Tid: 23.06.15, 09.00 -10.30. Møte nr.: 5	Prosjekt: Vann og avløp i Vollen hyttefelt		
Firma/person	Navn:	Møtte:	Referat:
Representant Vollheia VA utbygging SA	Ragnar Sand Flugom		X
Entreprenør Lars Sveen	Lars Sveen		X
Entreprenør Lars Sveen	Harald Sveen	X	X
Rørleggerfirma Erling Olsen AS	Kåre Olsen	X	X
Vollheia VA utbygging SA (Ingeniørtjenester AS)	Halvor Skåli	X	X

Saknr.	Emne:	Ansvar:
1/5	Referat fra møtet 09.06.15, ble gjennomgått. Det framkom ikke kommentar/merknader til referatet.	
2/5	Gjennomgang av SHM. 1. Det har ikke oppstått situasjoner som det skal meldes avvik for. 2. Anleggsområdet framstår som ryddig og oversiktlig. Det pågikk arbeider på stien ved skjæringen ovenfor hytta til Gjensidige. Framkommeligheten var ved befaringen sperret, men det legges opp til å gjenåpne så fort som mulig.	
3/5	Framdrift. 1. Hovedledningene for vann og avløp har blitt lagt i grøft og gjenfylt til på begge sider av skjæringa ovenfor hytta til Gjensidige, samt fra myrområdet ovenfor (nord) for hytta til Sønstebø. I løpet av torsdag regner de med at de har kommet opp til myra ved hytta til Werge Olsen med ferdig lagt hovedledninger. 2. Alle stikkledningene er lagt, samt stoppekranene for de enkelte stikkene.	
4/5	Fjell i traseen. I skjæringa ovenfor hytta til gjensidige er der fjell cirka 20 cm under grusdekke på stien. De har prøvde å «pigge» fjellet, men det var ikke mulig å komme dypt nok. Det må derfor foretas sprengning i en strekning på cirka 6 meter. Olsen informerer Risør kommune om dette.	


Neste byggemøte blir fredag 10. juli 2015, kl. 09.00.

23.06.15

Halvor Skåli

Halvor Skåli

VOLLHEIA VÅ UTBYGGING SA

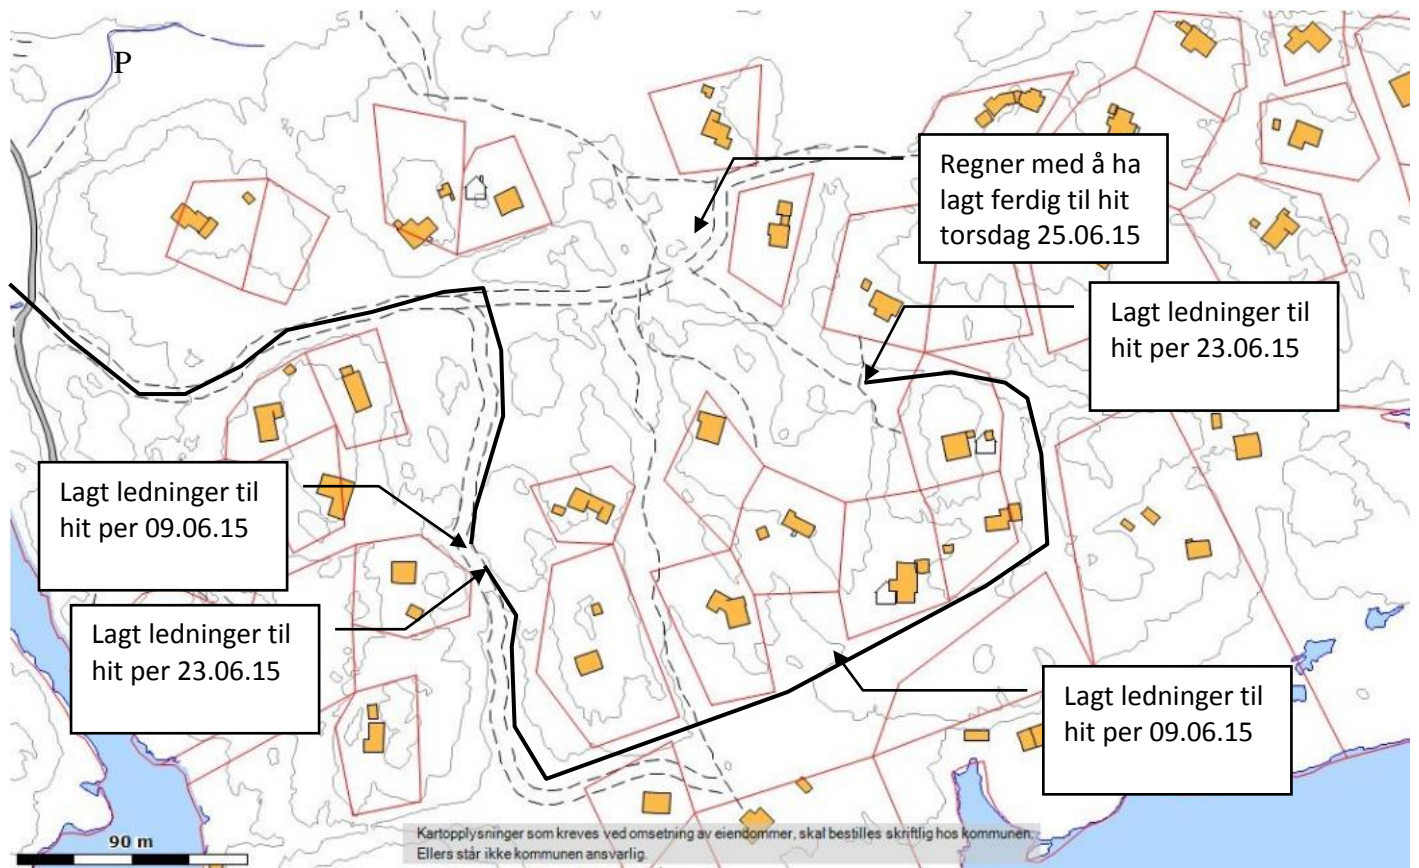

Alle stikkledningene er lagt fram til hyttene, med stoppekraner ved hovedledningene. Noen steder er de ikke dekt over enda.
